


REDESIGN V3 — COMMAND CENTER DARK

Plano completo de implementação por etapas

Documento de execução • Referência visual oficial • Setembro/2026

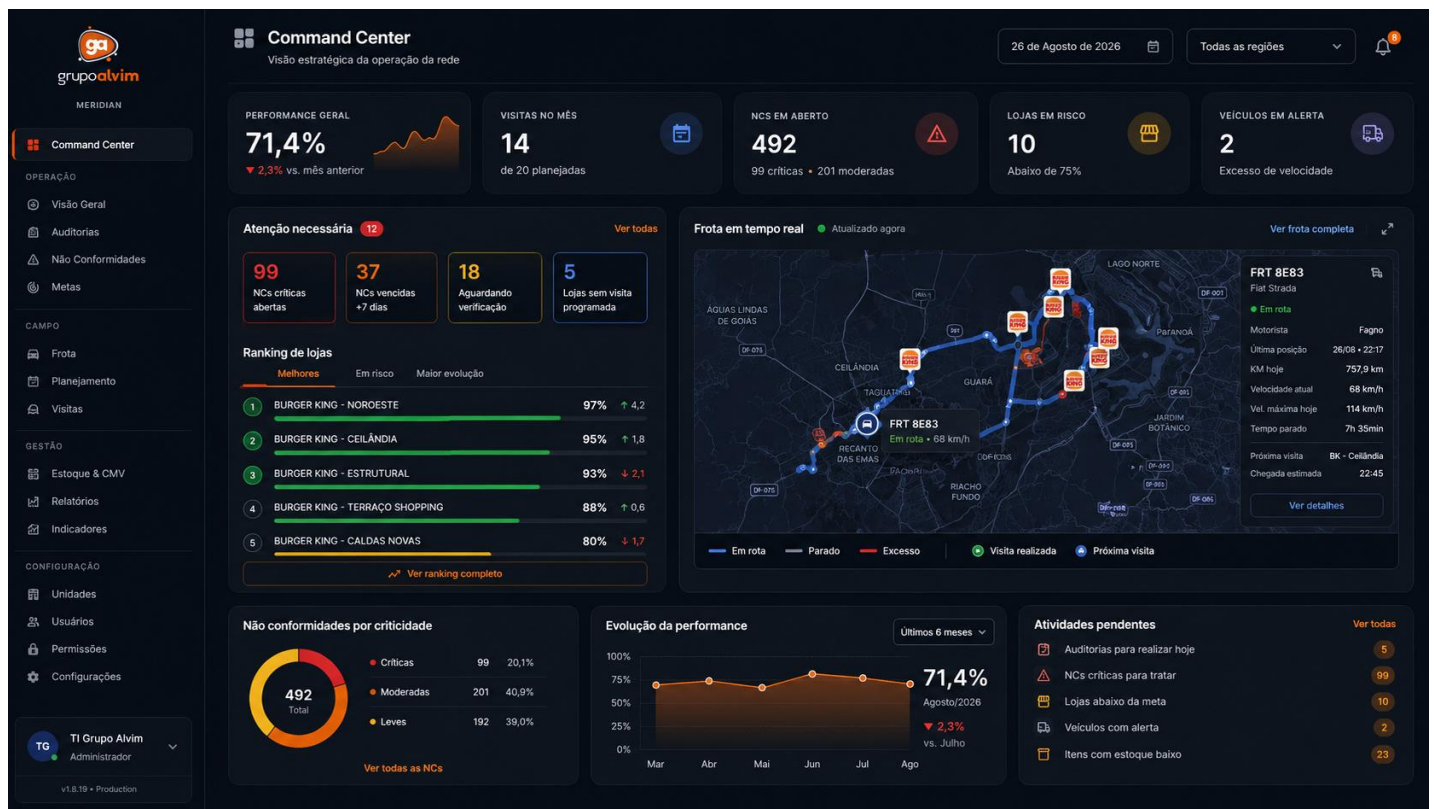

Referência visual aprovada — Meridian Command Center

1. Objetivo do projeto

Transformar a interface atual do MERIDIAN em uma plataforma operacional premium, com linguagem visual de Command Center dark, mantendo as regras de negócio e os dados reais do sistema. O novo Command Center será a primeira implementação e também a base do Design System utilizado nas demais abas.

Regra central

O print aprovado deve ser tratado como referência visual oficial. Não criar um design alternativo e não aplicar apenas um tema escuro sobre a interface atual.

2. Princípios obrigatórios

- Preservar regras de negócio, banco de dados, cálculos e integrações durante o redesign visual.
- Reaproveitar endpoints, queries, componentes e serviços existentes sempre que possível.
- Dados exibidos em produção devem ser reais; valores do mockup não devem ser hardcoded.
- Criar componentes reutilizáveis e tokens visuais antes de replicar estilos página por página.
- Cada etapa deve ser implementada, testada, comparada visualmente e validada antes da próxima.
- O resultado deve parecer um único produto: Command Center, Estoque, Frota, Visitas, Planejamento e demais módulos devem compartilhar a mesma linguagem.

3. Arquitetura visual oficial

3.1 Direção

Dark enterprise / operational command center. Fundo navy quase preto, superfícies em graphite/navy, bordas sutis, tipografia clara, laranja Grupo Alvim como assinatura e cores de status usadas semanticamente.

3.2 Hierarquia de cores

- Laranja: identidade, seleção, CTA e destaque.
- Verde: normal, concluído, positivo e dentro da meta.
- Amarelo: atenção e proximidade de limite.
- Vermelho: crítico, vencido, falha ou risco.
- Azul: informação, localização, planejamento e navegação.

3.3 Componentes base

- AppShell / Sidebar / Header
- Card e KPI Card
- StatusBadge
- Tabs
- Filter/Select/Date control
- DataTable
- ProgressBar
- Sparkline e gráficos
- AlertCard
- EmptyState / LoadingState / ErrorState

- Drawer/Detail panel
- Tooltip e modal de confirmação

4. Estrutura global e navegação

A sidebar passa a ser parte permanente do AppShell e deverá servir todas as páginas migradas.

Command Center

Command Center

Operação

Visão Geral • Auditorias • Não Conformidades • Metas

Campo

Frota • Planejamento • Visitas

Gestão

Estoque & CMV • Relatórios • Indicadores

Configuração

Unidades • Usuários • Permissões • Configurações

Rodapé da sidebar: usuário, perfil, ambiente/versão. Item ativo com fundo sutil, detalhe vertical laranja, ícone laranja e texto branco.

5. ETAPA 0 — Auditoria técnica antes de alterar

- Mapear framework, estrutura de rotas, layout global, biblioteca de ícones e biblioteca de gráficos.
- Localizar a implementação atual da página Início e seus endpoints.
- Mapear serviços de auditorias, NCs, metas, visitas, frota e estoque.
- Identificar o componente Leaflet/mapa já usado na Frota.
- Identificar quais KPIs do mockup já possuem dados reais e quais dependem de agregação adicional.
- Registrar arquivos que serão modificados e riscos de regressão.

Saída obrigatória

Relatório curto de arquitetura atual + lista de componentes/endpoints reutilizáveis + pontos ainda sem fonte de dados.

6. ETAPA 1 — Fundação visual do Command Center

- Criar tokens CSS/theme: backgrounds, surfaces, borders, text, brand e status.
- Criar AppShell dark com sidebar e header conforme referência.
- Implementar grid responsivo e largura útil equivalente ao mockup.
- Padronizar tipografia, radius, spacing, hover, focus e divisores.

- Criar componentes básicos reutilizáveis antes dos widgets de negócio.
- Aplicar o novo layout apenas à rota inicial/Command Center nesta etapa.

Critério de aceite

Sem dados complexos ainda, o esqueleto visual deve, lado a lado com o print, transmitir a mesma identidade, proporções e densidade.

7. ETAPA 2 — Cabeçalho e KPIs executivos

Implementar o cabeçalho 'Command Center — Visão estratégica da operação da rede', filtro de data, filtro de região e notificações.

KPI	Conteúdo
Performance Geral	percentual atual + variação vs. período anterior + sparkline
Visitas no mês	realizadas vs. planejadas
NCs em aberto	total + críticas/moderadas
Lojas em risco	quantidade abaixo do limite operacional
Veículos em alerta	quantidade com anomalias relevantes

Todos os KPIs devem consumir dados reais e possuir loading, empty state e tratamento de erro.

8. ETAPA 3 — Atenção necessária

- Criar bloco de prioridade operacional.
- Exibir NCs críticas abertas, NCs vencidas +7 dias, itens aguardando verificação e lojas sem visita programada.
- Cada indicador deve ser clicável quando houver rota de destino disponível.
- Não inventar métricas ausentes. Documentar dependências de backend.

9. ETAPA 4 — Ranking de lojas

- Reaproveitar o ranking operacional existente.
- Tabs: Melhores, Em risco, Maior evolução.
- Mostrar posição, loja, nota atual, barra de performance e tendência histórica.
- Adicionar ação 'Ver ranking completo'.
- Tendência só aparece quando houver histórico comparável.

10. ETAPA 5 — Frota em tempo real

- Reutilizar o Leaflet/mapa e os dados do módulo Frota; não usar imagem estática.
- Aplicar tiles/estilo compatível com dark mode.
- Mostrar lojas, veículos, trajeto, paradas, excessos, visita realizada e próxima visita.
- Criar painel de detalhe do veículo com motorista, posição, km, velocidade, tempo parado, próxima visita e ETA.
- Ação 'Ver frota completa' deve levar ao módulo dedicado.

Atenção

Essa área é um dos elementos de maior impacto do Command Center. Priorizar legibilidade do mapa e dados reais,

sem sacrificar performance.

11. ETAPA 6 — Não conformidades por criticidade

- Criar donut com total de NCs no centro.
- Distribuir por crítica, moderada e leve, com quantidade e percentual.
- Cores devem seguir a semântica global.
- Ação 'Ver todas as NCs' leva ao módulo de Não Conformidades.

12. ETAPA 7 — Evolução da performance

- Gráfico de linha/área com período selecionável, padrão últimos 6 meses.
- Mostrar nota atual, mês de referência e variação contra mês anterior.
- Usar dados históricos reais das auditorias/indicadores.
- Tooltip deve exibir período e valor com clareza.

13. ETAPA 8 — Atividades pendentes

- Agregar tarefas que exigem ação: auditorias do dia, NCs críticas, lojas abaixo da meta, veículos em alerta e itens com estoque baixo.
- Cada linha deve funcionar como atalho contextual.
- Ordenar por criticidade/urgência quando aplicável.
- Evitar transformar o bloco em simples lista decorativa; ele deve orientar ação.

14. ETAPA 9 — Estados, interações e micro UX

- Skeletons durante carregamento.
- Empty states explicativos.
- Erro de API com opção de tentar novamente.
- Tooltips em ícones não óbvios.
- Hover/focus coerentes e acessíveis.
- Transições discretas; sem animações excessivas.
- Badges e alertas semanticamente consistentes.

15. ETAPA 10 — Responsividade

Prioridade: desktop operacional. Validar obrigatoriamente:

- 1920×1080
- 1600×900
- 1440×900
- 1366×768

Em telas menores, reorganizar grid sem ocultar informações essenciais. Evitar scroll horizontal em cards/tabelas sempre que houver solução responsiva adequada.

16. ETAPA 11 — Performance e qualidade

- Evitar chamadas duplicadas para os mesmos dados.
- Agregar requests no backend quando isso reduzir custo e complexidade.
- Lazy-load do mapa e componentes pesados quando apropriado.
- Evitar re-renderizações desnecessárias.
- Validar console sem erros e network sem chamadas falhando silenciosamente.
- Manter compatibilidade com as rotas atuais.

17. ETAPA 12 — Migração das demais abas

Somente após aprovação do Command Center, aplicar o mesmo Design System às demais áreas, sem reinventar a identidade.

Fase	Módulo	Escopo
12A	Estoque & CMV	Vendas, Conferência, Break, Saldo e Cadastro
12B	Frota	Acompanhamento, mapa, relatórios e configurações
12C	Visitas/Auditorias	Histórico, execução, notas, status e NCs
12D	Planejamento	Escala de visitas, delivery, gestores e manutenção
12E	Metas e Indicadores	cards, tendências, ranking e comparativos
12F	Configurações	unidades, usuários, permissões e parâmetros

18. O que NÃO alterar durante o redesign

- Regras de auditoria e cálculo de notas.
- Motor de estoque, CMV, conversões e contagens.
- Integração e sincronização do BK Office.
- Estrutura e regras de NCs.
- Regras de frota, visitas ou metas.
- Banco de dados sem necessidade técnica formalmente aprovada.

19. Protocolo de validação por etapa

Validação	Resultado	Evidência
Implementação	PASS / FAIL	Log / screenshot / teste
Dados reais	PASS / FAIL	Log / screenshot / teste
Console	PASS / FAIL	Log / screenshot / teste
Network/API	PASS / FAIL	Log / screenshot / teste
Responsividade	PASS / FAIL	Log / screenshot / teste

Visual vs. referência	PASS / FAIL	Log / screenshot / teste
Regressão das funções existentes	PASS / FAIL	Log / screenshot / teste

Gate obrigatório

Não avançar para a etapa seguinte enquanto a etapa atual não estiver validada. Cada entrega deve incluir arquivos alterados, resumo do que foi feito, testes executados, resultado, screenshot e diferenças restantes.

20. Critério final de aceite

- Linguagem visual claramente igual à referência aprovada.
- Sidebar, header, grid, cards, tipografia, cores, bordas e espaçamentos consistentes.
- Todos os números vêm das fontes reais do MERIDIAN.
- Nenhuma regra de negócio foi alterada acidentalmente.
- Sem erros relevantes de console/API.
- Boa utilização em resoluções desktop previstas.
- Componentes construídos de forma reutilizável para as próximas abas.

21. Prompt operacional para o agente/desenvolvedor

INSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO

Utilize o print anexado “Meridian - New Version.png” como referência visual oficial do redesign.

Primeiro analise a arquitetura atual do projeto. Não altere regras de negócio, cálculos, banco de dados ou integrações apenas para atingir o visual.

Execute o plano por etapas, começando pela ETAPA 0 e seguindo a ordem deste documento. Em cada etapa:

1. informe os arquivos que pretende alterar;
2. implemente apenas o escopo daquela etapa;
3. execute testes;
4. abra a aplicação;
5. valide console e chamadas de API;
6. gere screenshot;
7. compare visualmente com a referência;
8. entregue relatório de PASS/FAIL e diferenças restantes.

Não avance automaticamente para a próxima etapa sem validação.

Sempre reutilize endpoints, serviços e componentes existentes quando apropriado. Dados do mockup são ilustrativos; em produção, use dados reais. O objetivo é transformar o MERIDIAN em um único produto visualmente consistente, iniciando pelo Command Center e depois migrando as demais abas para o mesmo Design System.

22. Checklist de entrega final do Command Center

- ☐ AppShell dark finalizado

- ☐ Sidebar e header finalizados
- ☐ Design tokens centralizados
- ☐ 5 KPIs conectados
- ☐ Atenção necessária conectada
- ☐ Ranking conectado
- ☐ Frota/mapa real integrado
- ☐ NCs por criticidade conectadas
- ☐ Evolução da performance conectada
- ☐ Pendências conectadas
- ☐ Loading/empty/error states
- ☐ Responsividade validada
- ☐ Console/API sem falhas relevantes
- ☐ Screenshot final comparado ao mockup
- ☐ Documentação de diferenças/dependências futuras

MERIDIAN V3 • Grupo Alvim • Command Center Dark
